

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

MINISTRY OF LABOUR AND VOCATIONAL TRAINING

គម្រោងពង្រឹងវិស័យអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ

STRENGTHENING TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING(STVET) PROJECT

ADB GRANT No. 0178-CAM


១. មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែប (ថ្មី)

PROVINCIAL TRAINING CENTER OF KEP


ក.ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែប

CONSTRUCTION OF PTC IN KEP PROVINCE

- ❖ ទីតាំងសាងសង់ (Location) ៖ ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប (Thmey Village, Sangkat Prey Thom, Kep City, Kep Province)
- ❖ សាងសង់ដោយ (Contractor) ៖ ក្រុមហ៊ុន T.S.K Construction Co., Ltd
- ❖ កិច្ចសន្យាលេខ (Contract No.) ៖ STVET/W/NCB/RTC-Package 3-Lot 3
- ❖ ទឹកប្រាក់សរុប (Total Amount) ៖ USD 210,414.58
- ❖ ថ្ងៃផ្តើមសាងសង់ (Started Date) ៖ ១៨ មីនា ២០១៤ (18th August 2014)
- ❖ ថ្ងៃបញ្ចប់សាងសង់ (Completion Date) ៖ ១៨ មិថុនា ២០១៥ (18th June 2015)

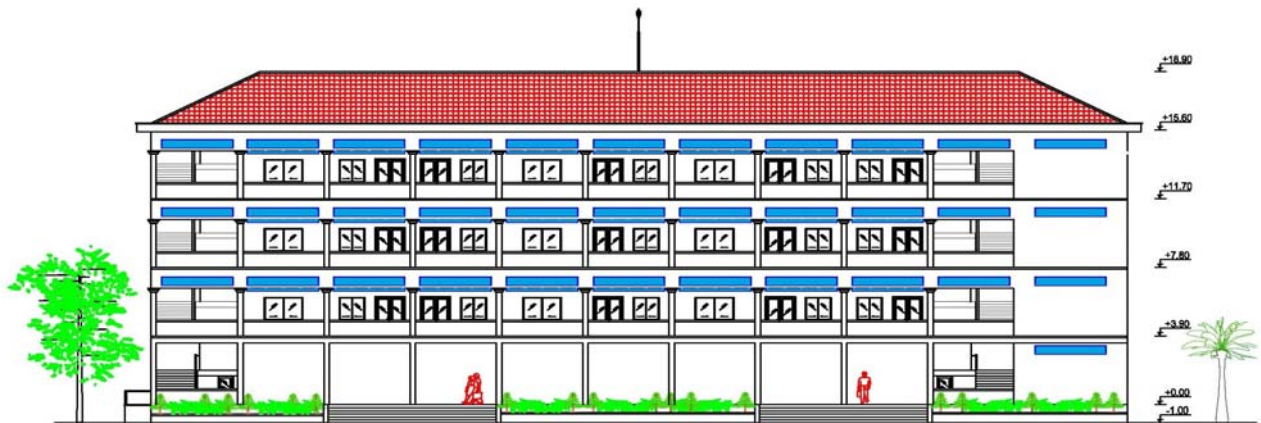

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែប ពេលអនាគត (PTC IN KEP IN THE FUTURE)

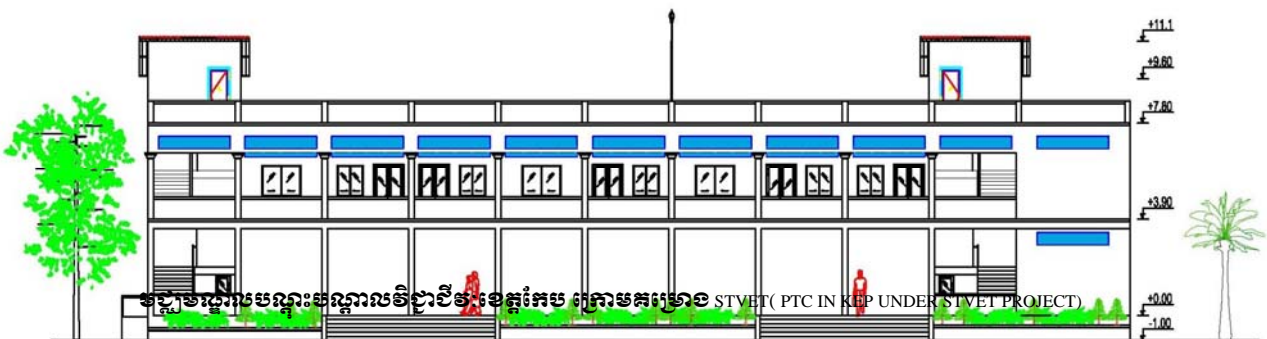

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែប ក្រោមការប្រោស STVET (PTC IN KEP UNDER STVET PROJECT)

ខ. វឌ្ឍនភាពនៃសំណង់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកែប

Construction Progress of New PTC in Kep Province

វឌ្ឍនភាពកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

Progress till date: October 2014

❖ ការងារតម្លើងពង្រីក និងកំរាល Install Beam & Floor Slab Form works	សម្រេចបាន ១០០% Completed 100%
❖ ការងារបេតុងកំរាលជាន់ទី១ 1 st Floor Slab Concrete works	សម្រេចបាន ១០០% Completed 100%
❖ ការងារចាក់បេតុងជាន់ទី១ 1 st Floor Beam Concrete works	សម្រេចបាន ១០០% Completed 100%
❖ លទ្ធផលរួម Overall progress	សម្រេចបាន ៤៥% Completed 45%



ការងារតម្លើងពង្រីក និងកំរាល
Beam & Floor Form works



ការងារតម្លើងពង្រីក និងកំរាល
Beam & Floor Form works



ការងារបេតុងសរសៃ
Concrete Columns works



ការងារបេតុងសរសៃ
Concrete Columns works
